

Statenmededeling

Onderwerp

Monitor Wind op land 2019

Datum

23 juni 2020

Documentnummer

GS : 4710953

PS : 4722707

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

Voortgang doelstelling Wind op Land in 2020

Aanleiding

Het Rijk en de provincies/IPO hebben in 2013 een gezamenlijke doelstelling afgesproken van 6000 megawatt (MW) wind op land in 2020. De opgave voor Noord-Brabant is 470,5 MW. Jaarlijks voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het kernteam Wind op Land, de Monitor Wind op Land uit om de voortgang en de knelpunten in deze gezamenlijke opgave te monitoren.

Op 26 juni 2020 is de 'Monitor Wind op land 2019' gepubliceerd en aan de Tweede kamer aangeboden. In de Monitor worden conclusies getrokken, landelijk en per provincie, waar u in deze statenmededeling nader over wordt geïnformeerd.

Bevoegdheid

De Monitor Wind op Land is een instrument om de voortgang en knelpunten rond de landelijke doelstelling wind op land 2020 in beeld te brengen. Deze wordt in het kader van uw controlerende bevoegdheid, ter informatie aan u voorgelegd.

Middels eerdere Statenmededelingen vanaf 2016 bent u de afgelopen jaren geïnformeerd over de voortgang van de windopgave Wind op land 2020. Op 2 juli 2019 hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de [Statenmededeling Monitor Wind op land 2018](#).

Kernboodschap

1. In de Monitor Wind op land van 2019 wordt geconstateerd dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de doelstelling 6000 MW wind op land operationeel in 2020 gehaald wordt. Ook van de opgave voor Noord-Brabant van 470,5 MW, wordt in de monitor geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat deze in 2020 gerealiseerd zal zijn.


Datum

23 juni 2020

Documentnummer

GS : 4710953

PS : 4722707

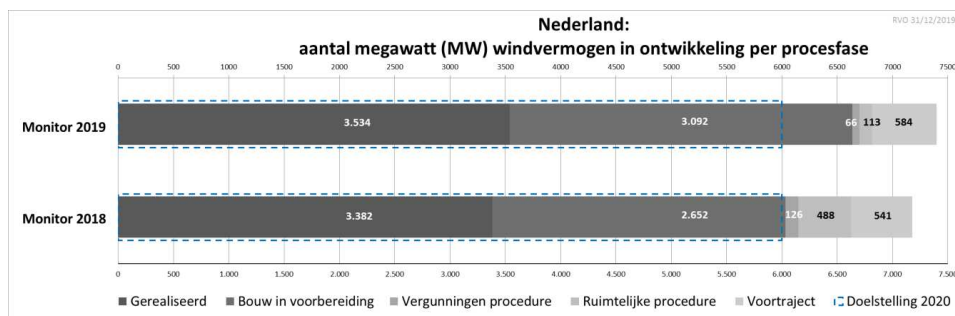

Voor de provincie Noord-Brabant constateert RVO dat er eind 2019 circa 240 MW (50 % van de provinciale opgave) geïnstalleerd vermogen wind op land stond. De verwachting is dat in 2020 circa 270 MW van de afgesproken 470,5 MW (57 %) van de provinciale doelstelling is gerealiseerd. Dat is lager dan het landelijke percentage (75%).

Zoals ook in voorgaande jaren is geconstateerd, zijn er meerdere projecten die om uiteenlopende redenen vertraging hebben opgelopen of zijn afgefallen. Bij kernboodschap 2 wordt verder ingegaan op de knelpunten die hiertoe hebben geleid, deze worden ook herkend en erkend door RVO en het rijk. Een groot deel van deze knelpunten is echter buiten de provinciale invloedssfeer gelegen. Kernboodschap 3 gaat hier verder op in.

2. Het is vanuit de provincie maar in beperkte mate mogelijk om tot een versnelling van realisatie van wind op land te komen.

In de monitor wordt geconstateerd dat in de provincie Noord-Brabant voortgang is geboekt, dat het geïnstalleerd vermogen windenergie ten opzichte van 2018 licht is toegenomen en dat de verwachting is dat er in 2020 in totaal circa 270 MW wind op land operationeel is.

Bij vrijwel alle windparken in Noord-Brabant is de bevoegdheid voor het doorlopen van de procedure en het vaststellen van de vergunningen aan de gemeente overgedragen, zodat nadere uitwerking daarmee op lokaal niveau kan plaatsvinden. Daarbij zijn waar gewenst en mogelijk kennis, expertise en ervaring vanuit de provincie aangeboden. De inspanningen van gemeenten en ondersteuning van provincie hebben helaas niet geleid tot een versnelling van de procedures. Dit heeft vooral te maken met het feit dat meerdere knelpunten buiten de invloedssfeer van provincie en gemeenten spelen. In kernboodschap 3 wordt hier nader op ingegaan.

3. Bij de ontwikkeling van windprojecten op land speelt een aantal generieke knelpunten. Dit zijn belemmeringen die in meerdere provincies spelen en waar we vaak geen directe invloed op hebben om deze te kunnen opheffen of beperken.

Datum

23 juni 2020

Documentnummer

GS : 4710953

PS : 4722707

In de monitor wordt aangegeven dat er verschillende landelijk knelpunten spelen die in een gezamenlijke aanpak tussen rijk, decentrale overheden en sector opgelost moeten worden. De knelpunten hebben onder meer betrekking op radarverstoring, hoogtebeperking rondom luchthavens, natuur/ecologie, obstakelverlichting, doorlooptijden in de rechtelijke procedures en (bestuurlijk) draagvlak en acceptatie. Het afgelopen jaar is daar de oplopende levertijd van windturbinefabrikanten bijgekomen, stikstof en de aansluiting op het elektriciteitsnet.

Met betrekking tot de netaansluiting trekken we als provincie, ook in het kader van de Regionale Energie Strategieën, nadrukkelijk op met de netbeheerder Enexis.

Voor meerdere windprojecten in Noord-Brabant spelen beperkingen op het gebied van defensieradar een rol, zowel in nabijheid van militaire vliegvelden als met betrekking tot (de onduidelijkheid over de verplaatsing van) radarpost Herwijnen. Met de ministeries van Defensie en EZK zijn we in nauw overleg over deze onderwerpen om te onderzoeken of we tot oplossingen kunnen komen.

Ook de lange doorlooptijden bij de Raad van State - ondanks de afspraak over verkorte beroepstermijnen - spelen een rol in de vertraging van windprojecten in Noord-Brabant. Doorlooptijden die vanwege de coronacrisis mogelijk nog langer worden. Dit speelt bijvoorbeeld bij de windenergie van EnergieA16, met ruim 100 MW een groot deel van de provinciale opgave.

Daarnaast spelen (politieke) discussies binnen gemeenten een rol bij vertraging van projecten. Dit heeft onder meer betrekking op projecten in de regio West-Brabant waarover in 2013 concrete afspraken met gemeenten zijn gemaakt, waarbij de projecten (destijds) gemeentelijke bestuurlijke instemming hadden. Toenemende aandacht voor maatschappelijk draagvlak, het goed uitwerken van financiële en sociale randvoorwaarden en/of een nieuwe politiek-bestuurlijke werkelijkheid binnen gemeenten hebben geleid tot andere en langere discussies en vroegen meer proces- en proceduretijd.

4. Het deel van de 6000 MW wind op land dat in 2020 niet gerealiseerd is, moet in 2023 verdubbeld zijn uitgevoerd.

In 2018 hebben minister Wiebes en IPO/provincies afgesproken dat het deel van de 6000 MW dat op 31 december 2020 niet is gerealiseerd, verdubbeld in 2023 gerealiseerd en operationeel moet zijn. Deze verdubbelingsopgave kan techniekneutraal worden uitgevoerd wat betekent dat, voor het deel boven de 6.000 MW, deze ook met zonneparken of andere vormen van duurzame opwek kan worden ingevuld.

De landelijke prognose voor eind 2020 komt erop neer dat dan naar verwachting 4500 MW van de landelijke doelstelling operationeel is. Verder wordt, op basis van het landelijke projectenoverzicht en de verwachte doorlooptijden van lopende procedures, gesteld dat het totale operationele windvermogen eind 2023 ruim boven de 6000 MW uit zal komen.

Datum

23 juni 2020

Documentnummer

GS : 4710953

PS : 4722707

Als voor Noord-Brabant wordt gekeken naar de windprojecten die in procedure zijn en/of worden gebouwd, onder meer de windparken langs de A16 en bij Industrierrein Moerdijk (pagina 41 van de monitor), dan is de verwachting dat in 2023 de voor 2020 afgesproken 470,5 MW aan windenergie is gerealiseerd in Noord-Brabant.

Peildatum voor de verdubbelingsopgave is 1 januari 2021, waarbij deze opgave onderdeel zal gaan uitmaken van de Regionale Energie Strategieën (RES' en) en daarmee bijdraagt aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van 35 TWh duurzaam geproduceerde energie op land in 2030. Deze doelstelling is namelijk inclusief alle wind- en zonneparken die in 2020 gerealiseerd zijn

Consequenties

De Monitor Wind op land maakt duidelijk waar we landelijk en per provincie staan met de afgesproken doelstelling van 6000 MW opgesteld vermogen wind op land in 2020. Uit de monitor valt af te lezen dat we achterlopen op de opgave en dat we, in samenwerking met het rijk en gemeenten en andere stakeholders, onverminderd inspanning moeten blijven leveren om knelpunten op te lossen en de afgesproken opgave wind op land 2020 te realiseren.

Zoals hiervoor aangegeven is de peildatum voor de verdubbelingsopgave 1 januari 2021. Ook op basis daarvan zullen, in samenspraak met de andere provincies en de Brabantse RES-regio's, nadere afspraken gemaakt moeten worden

Europese en internationale zaken

nvt

Communicatie

Het ministerie van EZK heeft op 26 juni jl. de monitor Wind op Land 2019 gepubliceerd.

Vervolg

Zie 'Consequenties' en 'Communicatie'.

Bijlagen

-Kamerbrief

-Windmonitor Wind op Land 2019

Datum

23 juni 2020

Documentnummer

GS : 4710953

PS : 4722707

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (06) 18 30 34 63,
icortenbach@brabant.nl.

Opdrachtnemer: mevrouw F. Grube, (06) 52 79 40 74, fgrube@brabant.nl.
