

Statenmededeling

Onderwerp

Monitor Wind op land 2018

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

GS: 4543049

PS: 4549075

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

Voortgang doelstelling Wind op Land in 2020

Aanleiding

Het Rijk en provincies/IPO hebben een gezamenlijke doelstelling van 6000 megawatt (MW) wind op land in 2020. De opgave voor Noord-Brabant is 470,5 MW. Jaarlijks voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het kernteam Wind op Land, de Monitor Wind op Land uit om de voortgang en de knelpunten in deze gezamenlijke opgave te monitoren. Op 28 juni 2019 is de '[Monitor wind op Land 2018](#)' gepubliceerd en aan de [Tweede Kamer](#) aangeboden. In de Monitor worden conclusies getrokken, landelijk en per provincie, waar u in deze statenmededeling nader over wordt geïnformeerd.

Bevoegdheid

De Monitor Wind op Land is een instrument om de voortgang en knelpunten rond de landelijke doelstelling wind op land 2020 in beeld te brengen. Deze wordt in het kader van uw controlerende bevoegdheid, ter informatie aan u voorgelegd.

Middels de [Statenmededeling Monitor Wind op land 2016](#) en de [Statenmededeling Monitor Wind op land 2017](#) bent u de afgelopen jaren eerder geïnformeerd over de voortgang van de windopgave Wind op land 2020.

Kernboodschap

1. In de Monitor Wind op land van 2018 wordt geconstateerd dat het onwaarschijnlijk is dat de doelstelling 6000MW wind op land in Nederland tijdig gehaald wordt. Hierin heeft Noord-Brabant ook een aandeel. Ook van de doelstelling van Noord-Brabant van 470,5 MW, wordt in de monitor geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat deze in 2020 gerealiseerd zal zijn.


Datum

2 juli 2019

Documentnummer

GS: 4543049

PS: 4549075

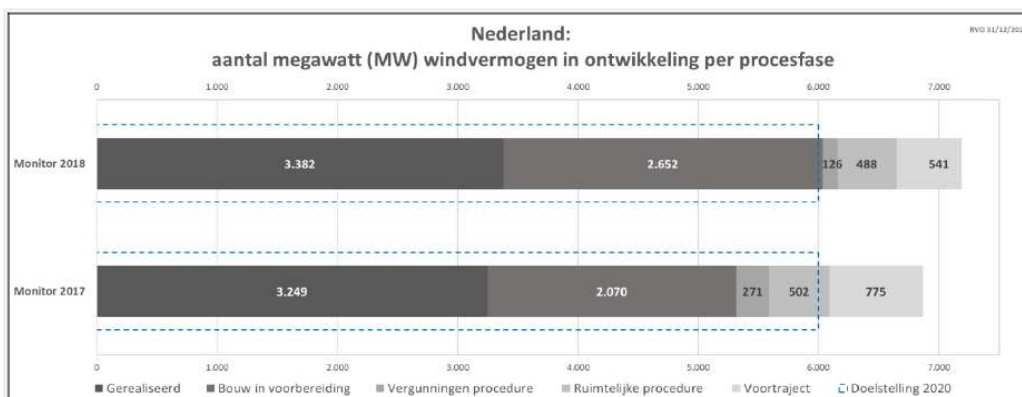

Figuur 1: Opgesteld en gepland vermogen in Nederland per procesfase (RVO 31/12/2018)

Voor de provincie Noord-Brabant constateert RVO dat er in 2020 277 MW van de afgesproken 470,5 MW (59 %) van de provinciale doelstelling is gerealiseerd. Dat is lager dan het landelijke percentage.

Evenals in eerdere jaren moeten wij constateren en erkennen dat er bij meerdere projecten vertraging optreedt. Waar knelpunten optreden proberen wij binnen ons netwerk met het aanspreken van de juiste contacten, en met ervaring, kennis en expertise, te komen tot oplossingen die bij dragen aan de doorgang en versnelling van projecten (kernboodschap 2 gaat hier verder op in) In de Monitor wordt dit ook erkend door RVO. Echter zijn de meeste van deze knelpunten buiten de provinciale invloedssfeer gelegen (kernboodschap 3 gaat hier verder op in).

2. Het is vanuit de provincie beperkt mogelijk om tot een versnelling op achterblijvende projecten in de realisatie van de opgave te komen.

De afgelopen jaren hebben we waar mogelijk op bestuurlijk en ambtelijk niveau ondersteuning geboden en druk uitgeoefend op lopende projecten. In de monitor wordt geconstateerd en erkend dat in de provincie Noord-Brabant voortgang is geboekt ten opzichte van de Monitor 2017 maar dat dat niet heeft geleid tot een versnelling van projecten waarmee de doelstelling in 2020 gehaald zou kunnen worden.

Wij blijven de gemeenten ondersteunen en adviseren waar we kunnen bij de realisatie van de windparken betrokken. Bij relatief recent opgestarte initiatieven geven we, in lijn met het nieuwe bestuursakkoord, onze rol als gelijkwaardige partner al steeds verder vorm. In de polders tussen Oss en 's-Hertogenbosch en in de Kempengemeenten werken wij al als partner samen met gemeenten om te komen tot een gebiedsverkenning en -ontwikkeling met een duurzaamheidsopgave, in wind en zon. De projecten die uit deze gebiedsprocessen voortkomen, zullen niet in 2020 gerealiseerd kunnen zijn, maar kunnen wel een bijdrage leveren aan de doelstelling tot 2023 (kernboodschap 4 gaat hier verder op in).

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

GS: 4543049

PS: 4549075

3. Bij de ontwikkeling van windprojecten op land spelen diverse knelpunten die in meerdere provincies spelen maar waar provincies zelf vaak geen directe invloed op hebben. In de monitor wordt gesteld dat een gezamenlijke aanpak tussen rijk, decentrale overheden en sector noodzakelijk is.

Gekeken naar de windprojecten in Noord-Brabant zorgen met name knelpunten op het gebied van defensieradarproblematiek (bij de initiatieven De Wildert in Dongen, Bedrijventerrein A50 in Veghel, vervanging Auvergnepolder in Bergen op Zoom, en twee locaties binnen windpark A16), en de lange doorlooptijd bij de Raad van State, ondanks de afspraak op basis van de Crisis en Herstelwet over verkorte beroepstermijnen (bij Rietvelden in 's-Hertogenbosch en Windpark A16) knelpunten. Deze issues zijn buiten het invloedsgebied van provincies gelegen, maar zullen op rijksniveau moeten worden aangepakt. Op gemeentelijk niveau spelen politieke discussies binnen gemeenten (vervanging en uitbreiding Karolinapolder in Steenberg, vervanging Auvergnepolder in Bergen op Zoom, vervanging en uitbreiding Ecopark in Waalwijk en naar aanleiding van de principeverzoeken voor windpark Amer en Raamsdonkveer in Geertruidenberg) gebaseerd op (onder meer) maatschappelijk draagvlak een grote rol bij de vertraging van windprojecten. Draagvlak en het uitwerken van voorwaarden op het gebied van participatie en maatschappelijke meerwaarde vragen om aandacht. Ook in het licht van de lopende RES-processen met als doel om te komen tot een bod en uitvoeringsprogramma om in 2030 minimaal 49% CO2-reductie te halen, zijn zorgvuldige processen van belang voor de duurzaamheidsdoelstellingen op de langere termijn. Aandacht en zorgvuldigheid kunnen extra tijd vergen.

4. Het deel van het aantal van 6000MW dat in 2020 niet gerealiseerd is, moet in 2023 verdubbeld zijn uitgevoerd.

Minister Wiebes en het IPO hebben afgesproken dat het deel van de doelstelling dat op 31 december 2020 niet is gerealiseerd in de periode tot 2023 wordt verdubbeld. Dit zogenaamde versnellingspakket kan techniek-neutraal worden uitgevoerd wat betekent dat, voor het deel boven de 6.000 MW, deze ook uit andere technieken bestaan dan wind op land. Vanwege deze versnellingsafpraak, biedt de monitor Wind op Land voor het eerst een doorkijk naar 2023.

Landelijk wordt gesteld dat dit betekent dat er eind 2023 nog bijna 1,5 GW (1500MW) extra hernieuwbaar vermogen moet zijn gerealiseerd. Voor Noord-Brabant wordt gesteld dat er in 2020 169,3 MW tekort aan opgesteld vermogen is, waaronder de ruim 100 MW van windpark A16, waardoor er voor 2023, naast de bestaande doelstelling van 470,5 er nog 169,3 bovenop komt, tot 639,8MW. We verwachten, met de gebiedsverkenningen die we uitvoeren, en het feit dat zonneparken ook meegerekend mogen worden, dat we deze doelstelling zouden kunnen gaan halen. Peildatum voor de versnellingsafspraken ofwel verdubbelingsopgave zal 1 januari 2021 zijn. Voor Noord-Brabant is het dan vooral van belang of windpark A16 dan gerealiseerd is, omdat het hier gaat om meer dan 100 MW die al dan niet verdubbeld zal worden. Binnen dit project zal de termijn van de uitspraak van de raad van State hiervoor bepalend zijn. Het versnellingspakket wordt meegenomen in de ontwikkeling van de RES'en, waar het onderdeel wordt van de nieuwe doelstelling van het ontwerp-Klimaatakkoord van 35 TWh duurzaam geproduceerde energie op land in 2030. Deze doelstelling is inclusief alle wind- en zonneparken die in 2020 gerealiseerd zijn.

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

GS: 4543049

PS: 4549075

Consequenties

Per specifiek initiatief of project zal bekeken moeten worden wat de rol en inbreng van de provincie is en wat hiervan de consequenties zijn. De extra doelstelling van 169,3 MW (van de huidige taakstelling van 470,5MW), waarvan nu door RVO wordt ingeschat dat deze niet in 2020 operationeel is, wordt pas bepaald op 1 januari 2021. RVO onderzoekt op dit moment hoe het versnellingspakket 2023 en monitoring RES'en zich tot elkaar gaan verhouden en hoe doelstellingen samenhangen.

Europese en internationale zaken

nvt

Communicatie

Naar aanleiding van het verschijnen van de 'Monitor Wind op Land 2018, is er een persbericht uitgegaan. U wordt voorjaar 2020 opnieuw op de hoogte gebracht van de voortgang in de doelstelling windenergie van onze provincie of zoveel eerder indien daar aanleiding toe is.

Vervolg

Zie 'Consequenties' en 'Communicatie'.

Bijlagen

-Kamerbrief
-Windmonitor Wind op Land 2018

Datum

2 juli 2019

Documentnummer

GS: 4543049

PS: 4549075

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (073) 681 26 79,
icortenbach@brabant.nl.

Opdrachtnemer: mevrouw F. Grube, (073) 680 82 09, fgrube@brabant.nl.
